


白鷹町立荒砥小学校(通学路合同点検対策済み箇所図)

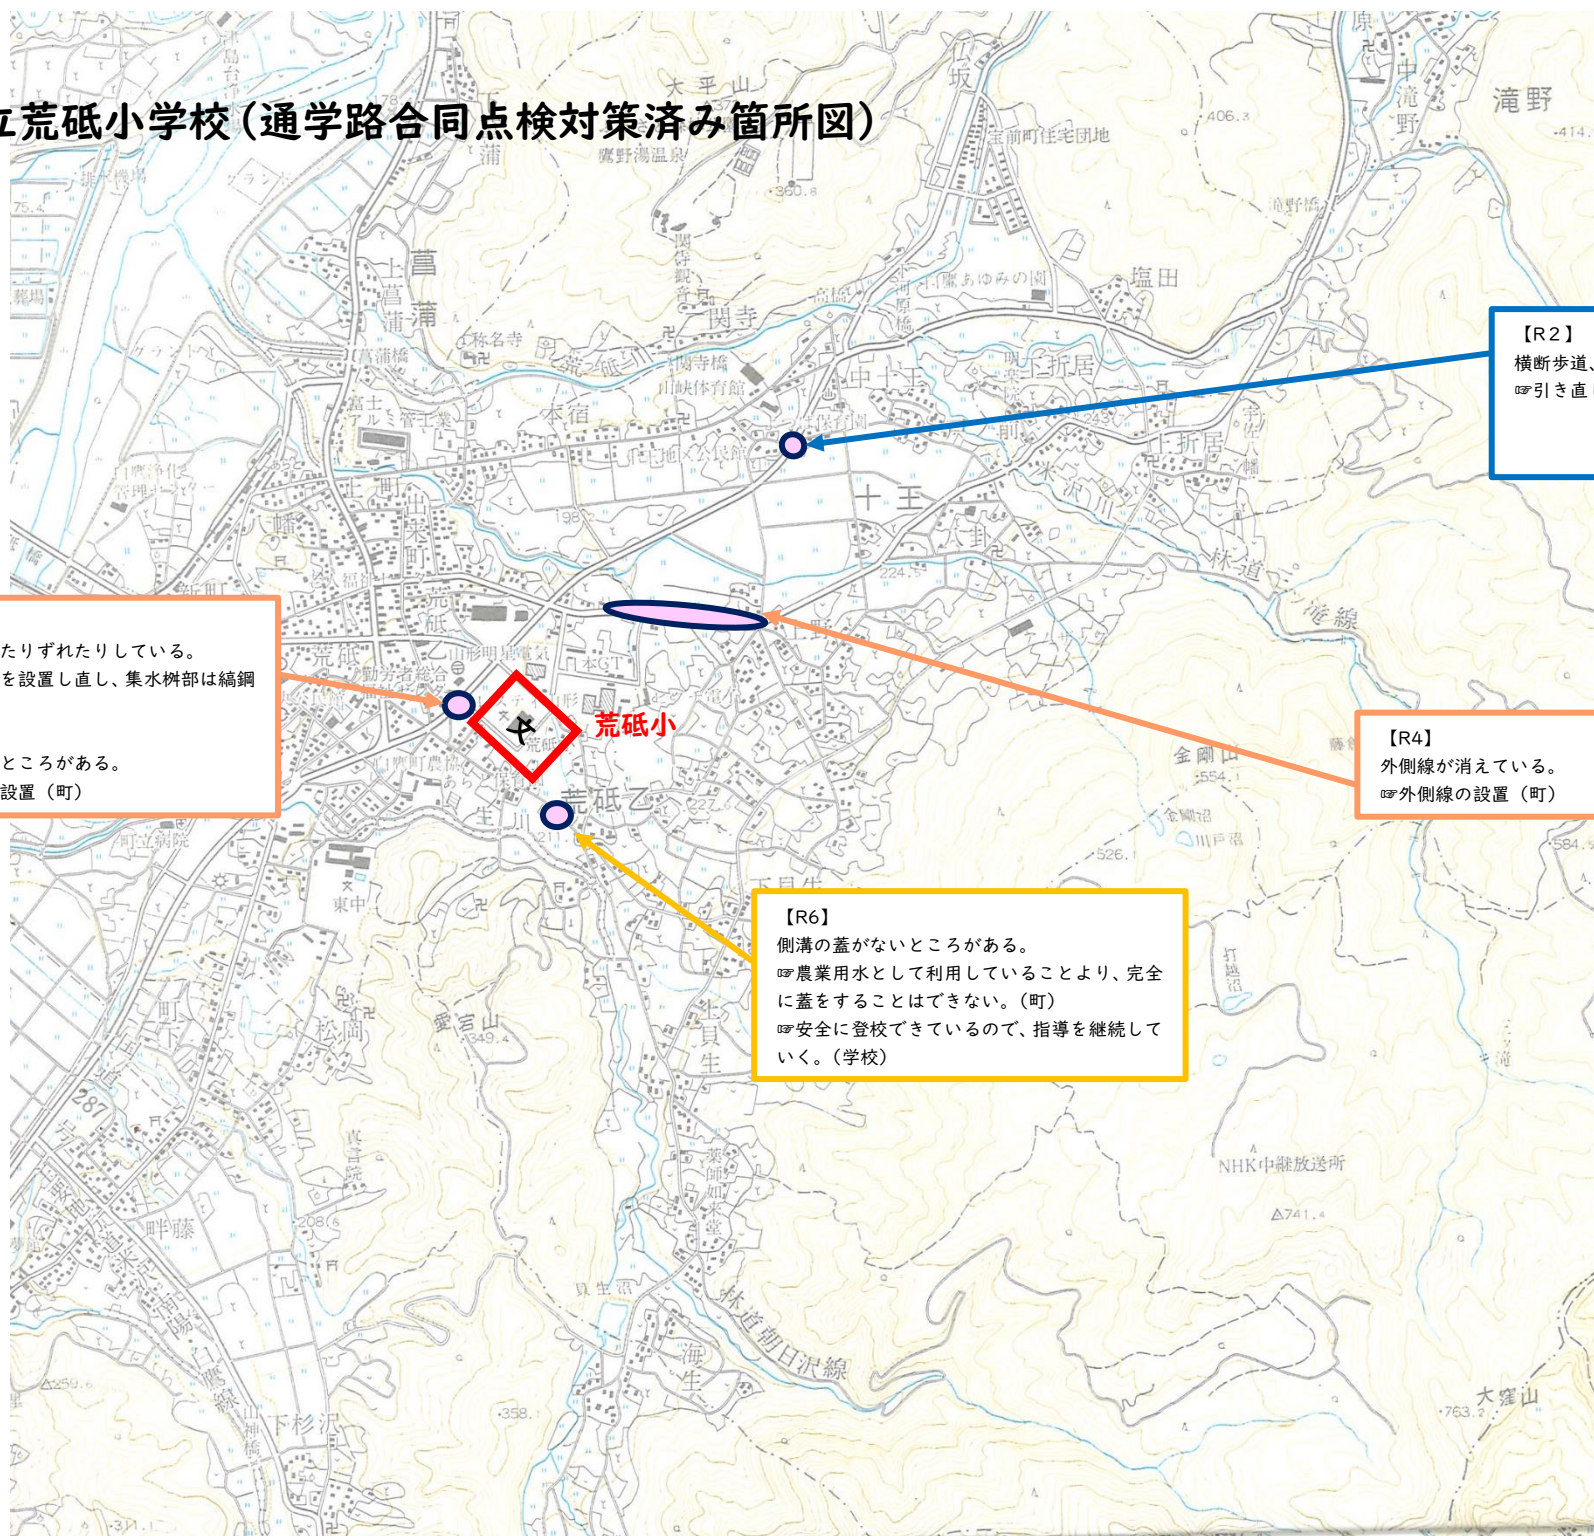

【R2】
横断歩道、停止線、止まれが薄い。
☞引き直し(県)

【R4】
側溝の蓋が外れたりずれたりしている。
☞グレーチングを設置し直し、集水柵部は縞鋼板を設置(町)
【R6】
側溝の蓋がないところがある。
☞グレーチング設置(町)

【R4】
外側線が消えている。
☞外側線の設置(町)

【R6】
側溝の蓋がないところがある。
☞農業用水として利用していることより、完全に蓋をすることはできない。(町)
☞安全に登校できているので、指導を継続していく。(学校)
